



**FOS SDE**  
**REX**  
**2014-15**

<b>Thème</b>	<b>Retour d'expérience sauvetage déblaiement FEU DE COMBLES DE MAISON</b>
--------------	---


<b>Généralité</b>	<p><b>Rédacteur et rôle :</b> CNE COLLARD, CT du COS.  <b>Date :</b> Dimanche 7 décembre 2014.  <b>GH :</b> 18h30 – 21h00  <b>Condition astrométéo :</b> Temps froid, nuit.  <b>Adresse :</b> 85 route des gorges St Paul en Cornillon</p>
-------------------	--

<b>Compte rendu</b>	<p><b>Situation à l'arrivée du CT SDE :</b> Feu dans les combles d'une maison R-1. Le feu est éteint. La ferme centrale de la charpente en partiellement détruite.  <b>Objectif :</b> Assurer la sécurité du site  <b>Idée de manœuvre :</b>          1 Relogement des occupants jusqu'à réparation de la charpente.          2 Etalement pour reprise des forces à l'aide d'étais (plus d'étais métalliques de 2 m due à une intervention SD la veille donc en bois)</p> <p><b>Exécution :</b>          1 : Les propriétaires se sont relogés par leurs propres moyens.          2 : Personnels SD : réalisation d'un étais vertical bois. Les clous de 120mm ne permettant pas d'assurer une fixation optimale des taquets. Nous avons réalisé deux étais verticaux à l'aide de poteaux reliés entre eux par une croix de St André.</p>
---------------------	---

<b>Point positif / éléments favorables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personnels motivés</li> <li>- Condition de travail</li> </ul>
--	--

<b>Points à améliorer / difficultés rencontrées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plus d'étais métalliques (laissés sur une intervention la nuit précédente)</li> <li>- Clous trop courts pour cloués des taquets de 100 mm.</li> <li>- Investir dans des clous de 150 mm.</li> </ul>
---	--

Destinataires	Date de création	Rédigée par	Validée par	MAJ	Réf.
FOS SDE	20/11/2014			0	REX

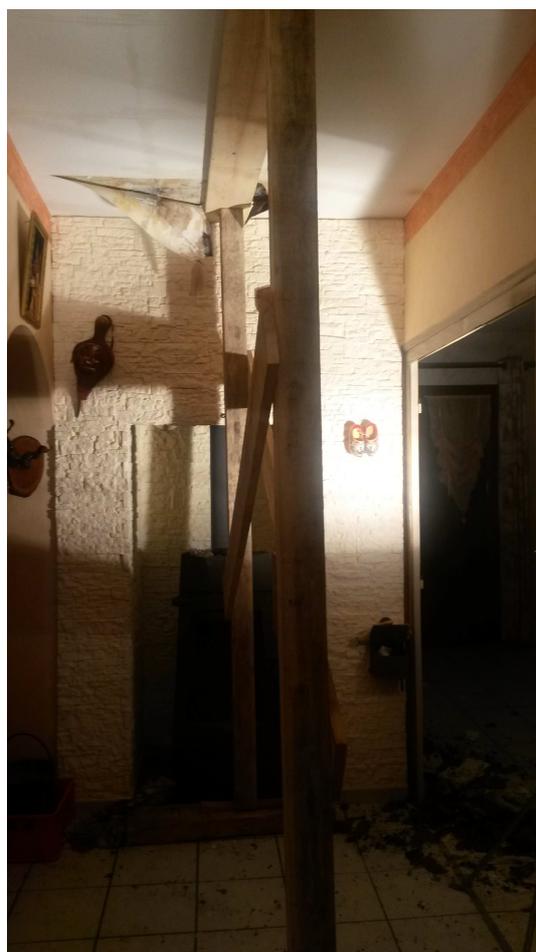

Destinataires	Date de création	Rédigée par	Validée par	MAJ	Réf.
FOS SDE	20/11/2014			0	REX
